


Nye Vejanlæg i Aalborg Syd Egnsplanvej

Gammel Gug Grundejerforening

23. april 2015


Claus Nødgaard Hansen

**Aalborg
Kommune**

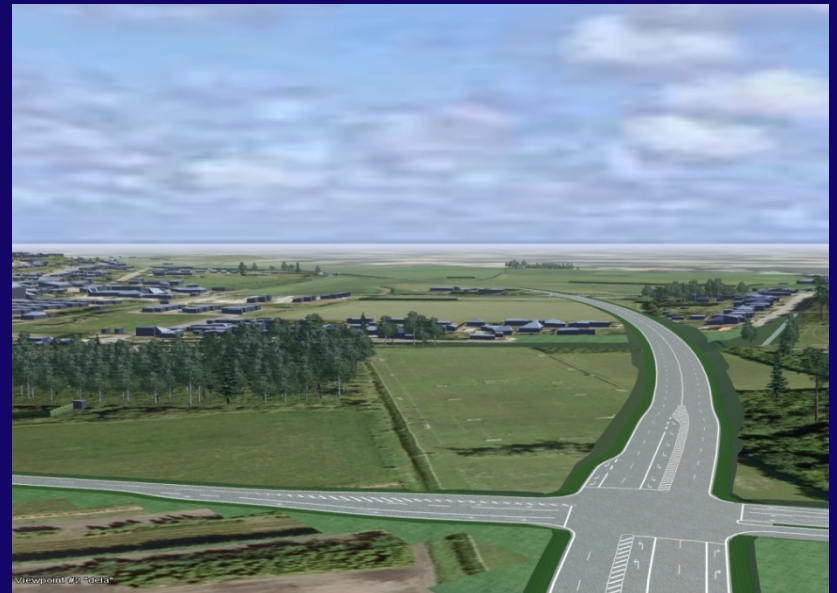

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd

3. Limfjordsforbindelse

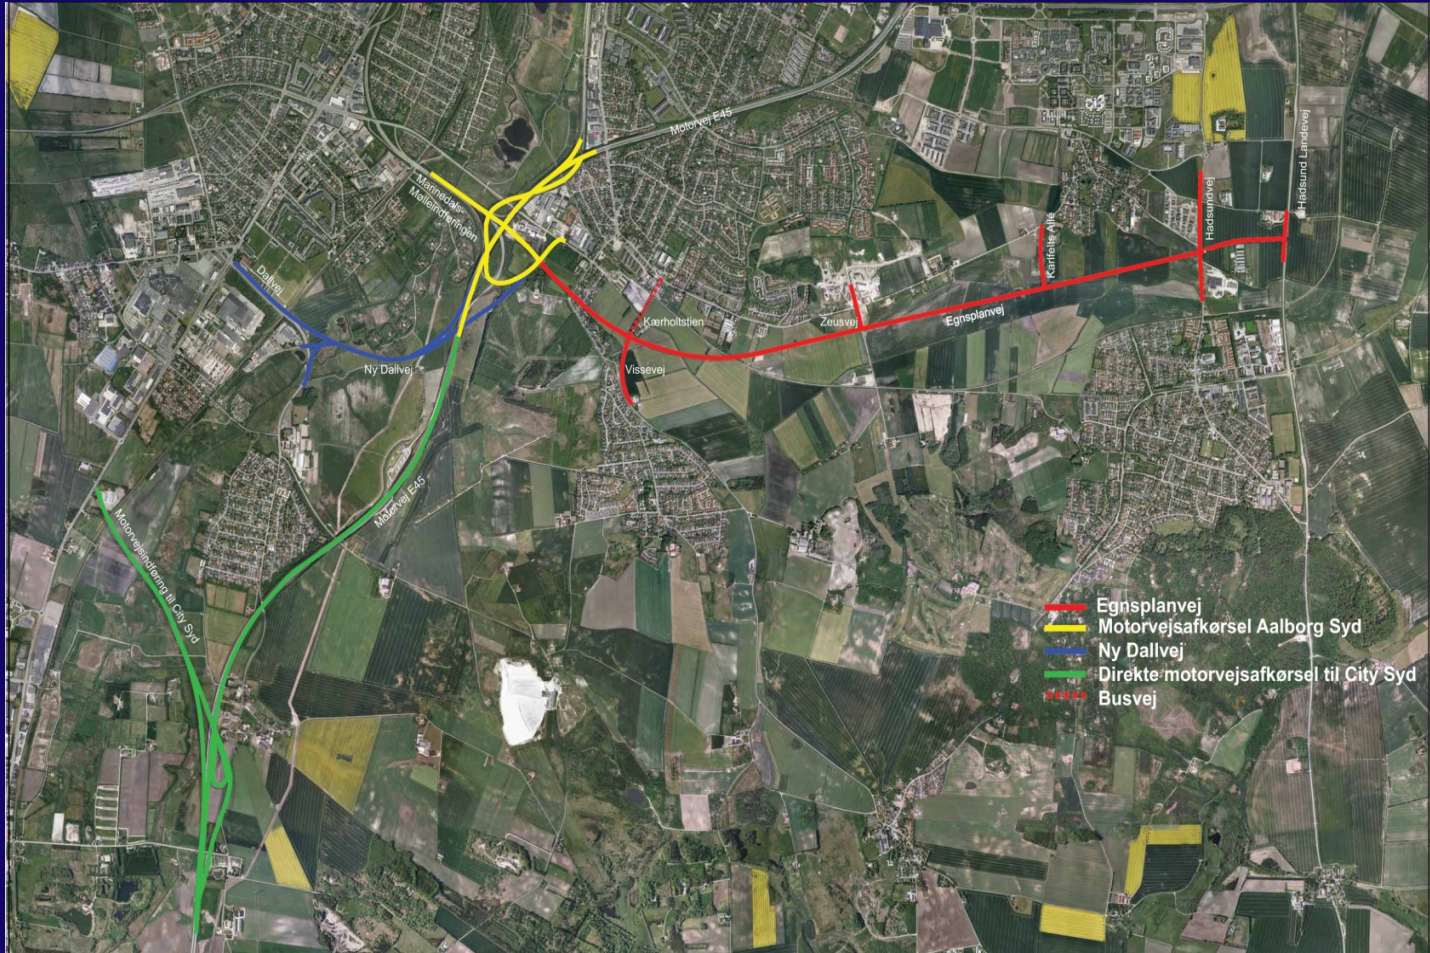

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd




**Aalborg
Kommune**

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd



Nye Vejanlæg i Aalborg Syd

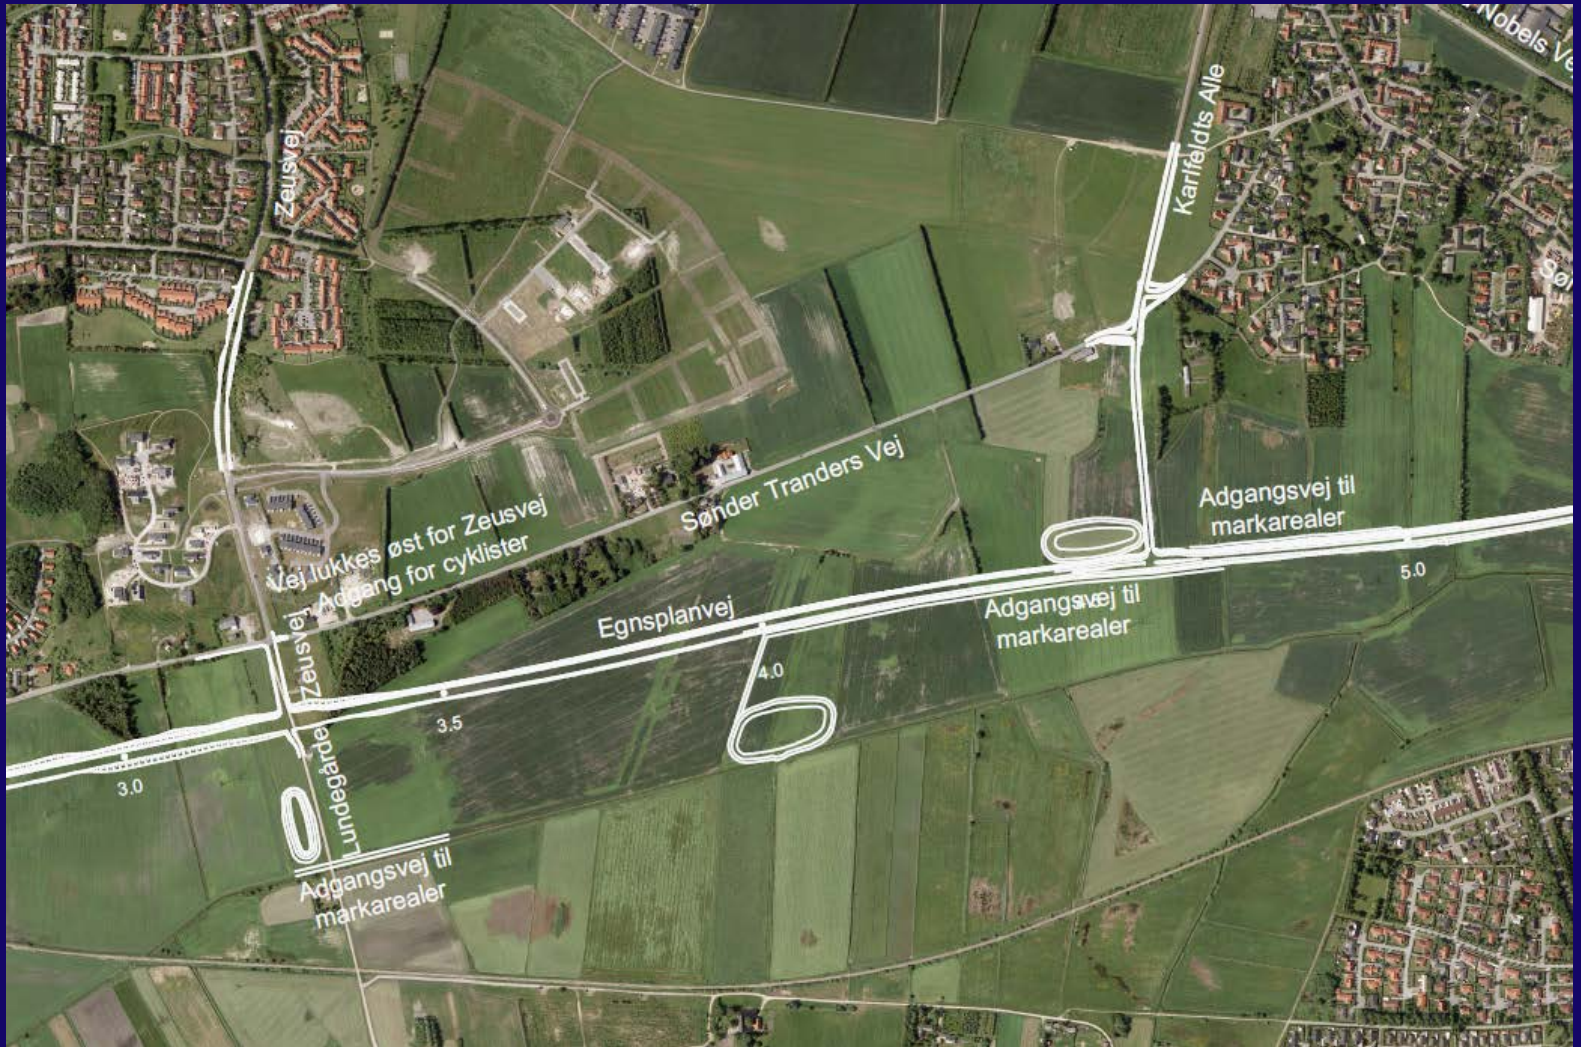

**Aalborg
Kommune**

Nye vejanlæg i Aalborg Syd



**Aalborg
Kommune**

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd


Projektets økonomi:

- Kontraktsum, M. J. Eriksson A/S- tilbudssum: 257 mio.
- Ekspropriationer m.v.: 12 mio.
- Projektering, udbud m.v.: 10 mio.
- Projektøpfølgning: tilsyn, ledninger, fredsskov m.v. 36 mio.
- Projektomkostninger i alt: 315 mio.

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd

Tidsplan og den videre proces:

- Entreprise kontrakt d.11. februar 2014:

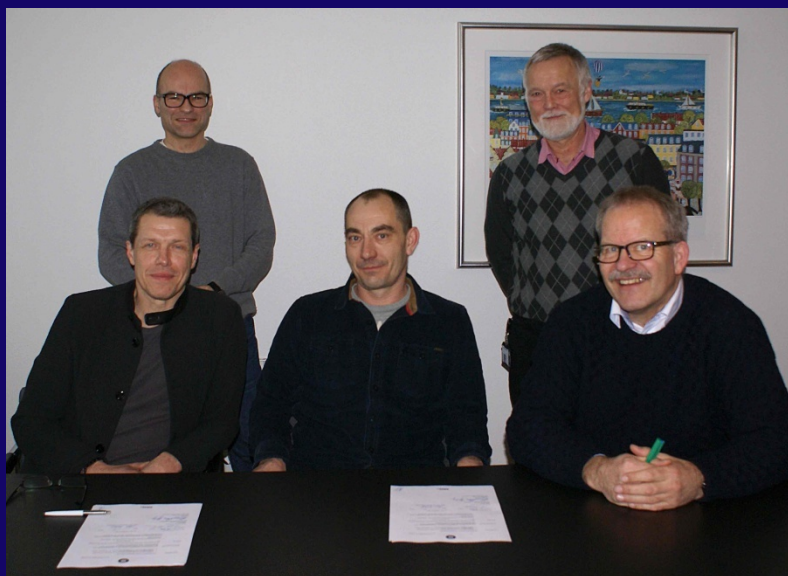

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| • Forventet opstart anlægsarbejder | Forår/sommer 2014 |
| • Banebro ved Gug færdig | 31. december 2015 |
| • Zeusvejs forlængelse færdig | 1. juni 2016 |
| • Aflevering af færdigt anlæg | November 2016 |

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd

Den reviderede tidsplan:

- Åbning af vej: November 2017
- Drænarbejder samt forbelastninger: Sommer 2015
- Vandløbstunnel ved Indkildestrømmen: Sommer 2015
- Stitunnel arbejder Kærholt + Vissevej Sommer/efterår 2015
- Rundkørsel på Hadsund Landevej + sygehus: Sommer/efterår 2015
- Banebro ved Gug: Sommer/efterår 2015
- OF – Egnspanvej: Efterår 2015
- Zeusvejs forlængelse: Medio 2016

FOKUS FRA OMVERDENEN !

**Kommunal bommert
forsinker Egnspanvej**

Bump på Egnspanvej

”Elendig projekt !”

**Glemte at
ansøge sig selv
om tilladelse
til drænanlæg**

Kommune graver sand - uden tilladelse



**Aalborg
Kommune**

FOKUS FRA OMVERDENEN !

Venter på grønt lys til at gå videre med Egnspanvej

”Fyr projektlederen!”

Ansvar for bommert skal placeres

Aalborg Kommune pudser advokat på Egnspanvej-gate

Direktoratet klapper kassen i



**Aalborg
Kommune**

Nye vejanlæg i Aalborg Syd

Vil du vide mere, så kontakt:

Projektleder

Claus Nødgaard Hansen

Tel.: 99312377/25202377

Mail: claus.hansen@aalborg

Linket til hjemmesiden:

<http://www.aalborg.dk/trafik-pas-og-transport/veje/aktuelle-vejprojekter/egnsplanvej>

Ekstra slides

Gug Boldklub – nyt baneanlæg




Forundersøgelser for Egnsplanvej

VVM-redegørelse & Miljøvurdering Nye vejanlæg i Aalborg Syd



**Egnsplanvej,
Nyt tilslutningsanlæg til E45
samt Ny Dallvej eller
Motorvejsindføring til City Syd**

Nye vejanlæg - Støjniveau

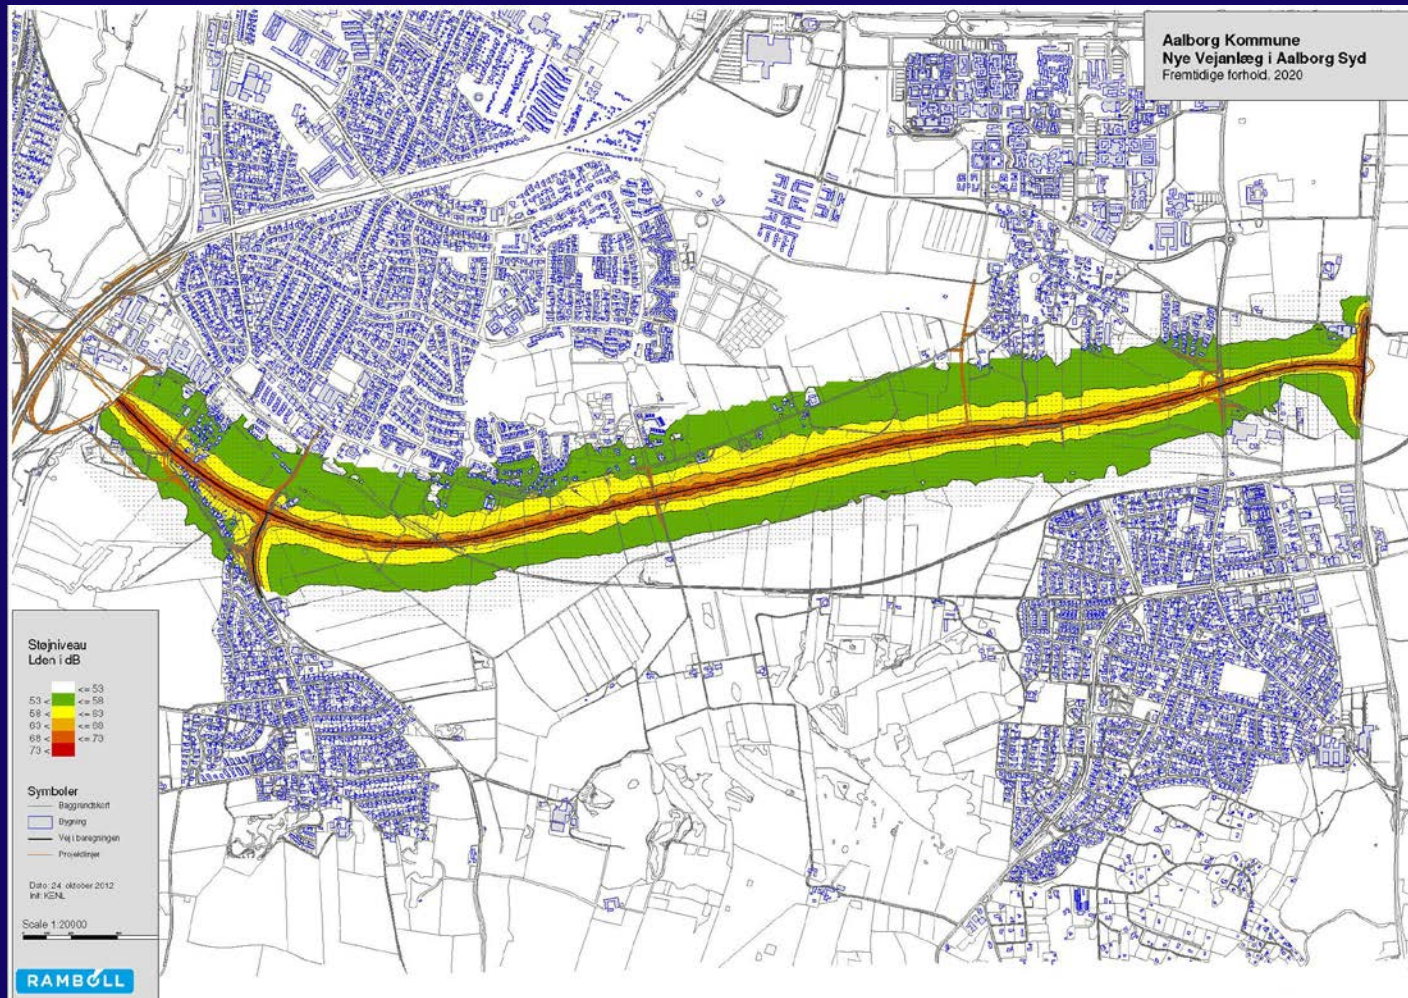

**Aalborg
Kommune**

Nye vejanlæg - Støjniveau



**Aalborg
Kommune**
